



DIRECÇÃO DE SERVIÇOS E AMBIENTE  
MARINHO E SUSTENTABILIDADE  
Exmo. Sr. Director Geral, Eng. José Carlos  
Simão

Viana do Castelo, 09/06/2017

Assunto: **WS\_C011 NAVIO DRAGA**  
*Pedido de Título para Autorização de Provas de Dragagem*

*Exmo. Sr. Director Geral, Eng. José Carlos Simão*

*WESTSEA – ESTALEIROS NAVAIS, LDA, com sede na Avenida da Praia Norte, S/N, Freguesia de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela, Viana do Castelo, NIPC 510 872 646, tendo contratado com a firma DRAGUS INT, LDA, com sede na Rua Maestro Virgílio Pereira, N.º 22 2º Dto., 4580 Paredes, a construção de um navio draga, com comprimento fora-a-fora de 73m e cerca de 1747 TDW, sob a designação provisória de construção n.º WS\_C011, vêm por este meio requerer a V.Exa. o respectivo Pedido de Título de Autorização de Provas de Dragagem, cujos elementos caracterizadores se encontram de seguida devidamente discriminados.*

*WESTSEA – ESTALEIROS NAVAIS, LDA, garante que não apresenta quaisquer tipos de dividas à Segurança Social e Finanças (IRS), conforme comprovado no anexo I do presente documento.*

*Esta nova construção tem o processo N-26-2017 da DGRM, Bandeira Portuguesa e com a classificação Bureau Veritas: BV class I; ✕ HULL; • MACH; AUT-UMS; Split Hopper Dredger Unit; Temporary unrestricted navigation within 15 miles from shore or within 20 miles from port;*

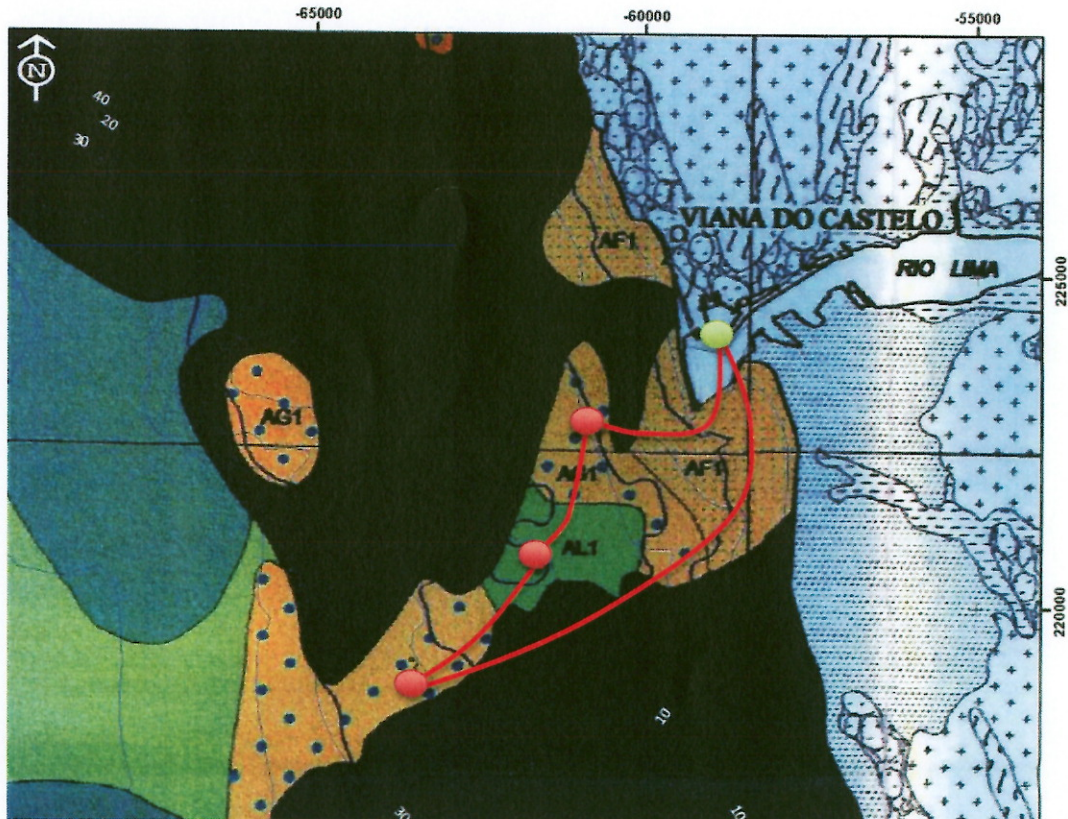


Imagem 1: Representação do Itinerário das Provas

	Operação	Início	Fim
1	Saída de Viana do Castelo	08:00	08:15
2	Deslocação ao local da 1ª Prova de Dragagem	08:15	09:00
3	Início da 1ª Operação de Dragagem a 20m	09:00	10:00
4	Avaliação do correcto funcionamento da 1ª Operação de Dragagem a 20m	09:50	10:10
5	Início da 2ª Operação de Dragagem a 20m	10:10	11:00
6	Avaliação do correcto funcionamento da 2ª Operação de Dragagem a 20m	11:50	11:05
7	Deslocação ao local da 2ª Prova de Dragagem	11:00	11:15
8	Início da 1ª Operação de Dragagem a 30m	11:15	12:00
9	Avaliação do correcto funcionamento da 1ª Operação de Dragagem a 30m	11:50	12:10
10	Início da 2ª Operação de Dragagem a 30m	12:10	13:00
11	Avaliação do correcto funcionamento da 2ª Operação de Dragagem a 30m	13:50	13:05
12	Confirmação da correcta operação de todos os sistemas de dragagem	13:00	14:00
13	Deslocação ao local da 3ª Prova de Dragagem	14:00	14:15
14	Início da 1ª Operação de Dragagem a 40m	14:15	15:15
15	Avaliação do correcto funcionamento da 1ª Operação de Dragagem a 40m	15:05	15:30
16	Início da 2ª Operação de Dragagem a 40m	15:30	16:30
17	Avaliação do correcto funcionamento da 2ª Operação de Dragagem a 40m	16:20	16:40
18	Regresso aos Estaleiros da West Sea	16:40	17:30

Tabela 3: Planeamento Preliminar das Provas
